

Государственная программа Хабаровского края
"Формирование современной городской среды"

Ответственный исполнитель:
Министерство жилищно-коммунального хозяйства края

ОТЧЕТ
о ходе реализации государственной программы
за 9 месяцев 2022 года

"19" октября 2022 года
(дата составления отчета)

И.о. министра жилищно-
коммунального хозяйства
Хабаровского края



С.В. Кондаков

Исполнитель:
Жданова Снежана Николаевна
главный специалист отдела по
формированию комфортной городской
среды,
тел. 32 40 77 (3028),
e-mail: snzhdanova@adm.khv.ru

СВЕДЕНИЯ						
о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы "Формирование современной городской среды" за 9 месяцев 2022 года						
(наименование программы)						
№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			Предшествующий год (факт)	отчетный год		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды					
1.1.	Количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий, представленных в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации для включения в Федеральный реестр лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	единиц	4,00	2,00	0,00	В соответствии с соглашением между Правительством края и Минстроем России (№ 069-09-2022-651 от 29.12.2021) практики (проекты) благоустройства направляются до 01.12.2022
2.	Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды					
2.2.	Количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий в муниципальных образованиях, включенных в план социального развития центров экономического роста Хабаровского края	единиц	78,00	160,00	20,00	показатель рассчитывается по итогам года. На 01.10.2022 завершены 20 дворовых территорий.
3.	Реализация регионального проекта Хабаровского края "Формирование комфортной городской среды"					
3.1.	Среднее значение индекса качества городской среды по Хабаровскому краю	у.е.	178,00	187,00	178,00	показатель рассчитывается Минстроем России в апреле в году, следующем за годом выполнения мероприятия, в соответствии с Методикой оценки индекса качества городской среды, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 23.03.2019 № 510-р. Фактические значения на отчетную дату указаны по итогам 2021 года.
3.2.	Прирост среднего значения индекса качества городской среды по Хабаровскому краю по отношению к 2018 году	процентов	9,00	14,00	9,00	показатель рассчитывается Минстроем России в апреле в году, следующем за годом выполнения мероприятия, в соответствии с Методикой оценки индекса качества городской среды, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 23.03.2019 № 510-р. Фактические значения на отчетную дату указаны по итогам 2021 года.
3.3.	Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50 процентов)	процентов	43,00	43,00	43,00	показатель рассчитывается Минстроем России в апреле в году, следующем за годом выполнения мероприятия, в соответствии с Методикой оценки индекса качества городской среды, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 23.03.2019 № 510-р. Фактические значения на отчетную дату указаны по итогам 2021 года.
3.4.	Количество городов с благоприятной городской средой	единиц	3,00	3,00	3,00	показатель рассчитывается Минстроем России в апреле в году, следующем за годом выполнения мероприятия, в соответствии с Методикой оценки индекса качества городской среды, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 23.03.2019 № 510-р. Фактические значения на отчетную дату указаны по итогам 2021 года.
3.5.	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %	процентов	16,85	20,00	0,00	показатель рассчитывается по итогам года
3.6.	Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), нарастающим итогом, начиная с 2019 г.	единиц	388,00	443,00	445,00	Показатель рассчитывается по итогам года. По состоянию на 01.10.2022 благоустроены 445 общественных территорий, в том числе 2019 год - 137 территорий, 2020 год - 121 территория, 2021 год - 130 территорий, 2022 год - 57 территорий.
3.7.	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды	процентов	100,00	90,00	100,00	В соответствии с методикой расчета, определенной Минстроем России, показатель рассчитывается до 01.04 текущего года по итогам за предыдущий. Фактические значения на отчетную дату указаны по итогам 2021 года. Факт по 2022 году будет доведен до субъектов РФ в апреле 2023 г.

И.о. министра жилищно-коммунального хозяйства

С.В. Кондаков

СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения основных мероприятий государственной программы Хабаровского края "Формирование современной городской среды"
за 9 месяцев 2022 года
(наименование программы)

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, исполнитель, участник	Результат реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия *		Степень реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (выполнено в полном объеме/частично/использовано)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия; меры, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий выполнения мероприятия не в полном объеме/частично/использовано
			запланированные	достигнутые		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды	министерство жилищно-коммунального хозяйства края, органы местного самоуправления (по согласованию), организации (граждане) (по согласованию)				
1.1.	Разработка нормативных правовых актов Хабаровского края и органов местного самоуправления Хабаровского края по формированию современной городской среды	министерство жилищно-коммунального хозяйства края, органы местного самоуправления (по согласованию), организации (граждане) (по согласованию)	актуализация государственной программы края; утверждение (актуализация) муниципальных образований, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, муниципальных программ формирования современной городской среды; разработка (актуализация) и утверждение паспорта регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" в рамках реализации Национального проекта "Жизнь и городская среда"	В 2022 году актуализирована государственная программа Хабаровского края "Формирование современной городской среды", утвержденная постановлением Правительства края от 31.08.2017 № 356-пр (постановления Правительства края от 13.01.2022 № 2-пр, от 31.03.2022 № 164-пр). Муниципальные программы муниципальных образований края – участников регионального проекта также актуализируются ежегодно, в том числе по итогам проведения оценок эффективности по отбору общественных территорий, подлежащих первоочередному благоустройству. В паспорт регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2022 году внесены изменения 21.02.2022, 22.06.2022, 20.09.2022, 10.10.2022.		
1.2.	Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходов бюджета муниципальных образований края по реализации муниципальных программ формирования современной городской среды на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.	министерство жилищно-коммунального хозяйства края, органы местного самоуправления (по согласованию), собственники (граждане)	Проведение работ по благоустройству дворовых территорий в 2022 году с использованием субсидии (в случае предоставления субсидии)	Иные межбюджетные трансферты на 2022 год – 121,00 млн. рублей. План – 160 дворовых территорий, находящихся в сферах экономического роста Хабаровского края: - г. Хабаровск (53 территории); - г. Комсомольск-на-Амуре (60 территорий); - г. Амурск (13 территорий); - г. Вилюй (3 территории); - г. Вязьский (4 территории); - г. Николаевск-на-Амуре (7 территорий); - г. Советская Гавань (13 территорий); - рп. Чегдомин (3 территории); - рп. Ванно (2 территории). На 01.10.2022 завершены 20 дворовых территорий. В рамках национального проекта "Жизнь и городская среда" реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий не осуществляется с 2019 года.	реализация мероприятия будет оценена по итогам года	реализация мероприятия будет оценена по итогам года
2.	Реализация регионального проекта "Формирование комфортной городской среды"	министерство жилищно-коммунального хозяйства края, органы местного самоуправления (по согласованию), собственники (граждане)				
2.1.	Поддержка муниципальных программ по формированию современной городской среды	министерство жилищно-коммунального хозяйства края, органы местного самоуправления (по согласованию), собственники (граждане)	Проведение работ по благоустройству общественных территорий в 2022 году	Участниками проекта в 2022 году стали 53 муниципальных образований края. План – 91 общественная территория. Общий бюджет составил не менее 377,4 млн. рублей, в том числе: - федерального бюджета – 337,8 млн. рублей; - краевого бюджета – 10,4 млн. рублей; - местных бюджетов прогнозно – 29,2 млн. рублей. Контракты заключены на все территории. По состоянию на 01.10.2022 работы завершены на 57 территориях, ведутся работы на 34 территории.	реализация мероприятия будет оценена по итогам года	реализация мероприятия будет оценена по итогам года
2.2.	Организация и проведение общественных обсуждений с целью вовлечения граждан в принятие решений по вопросам развития городской среды	министерство жилищно-коммунального хозяйства края, органы местного самоуправления (по согласованию), граждане, организации (по согласованию)	министерство жилищно-коммунального хозяйства края, органы местного самоуправления (по согласованию), граждане, организации (по согласованию)	проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды в муниципальных образованиях Хабаровского края, в том числе по результатам оценок эффективности	выполнено	

Результат реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия *					Степень реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (выполнено в полном объеме/частично/использованы средства мероприятия)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия; мера, направленные на нейтрализацию/снятие негативных последствий выполнения мероприятия (выполнено в полном объеме/частично/использованы средства мероприятия)
№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Закончившие	Достижимые		
1	2	3	4	5	6	7
2.3.	Разработка и реализация перечня мероприятий по цифровизации городского хозяйства края	министерство жилищно-коммунального хозяйства края, органы местного самоуправления (по согласованию)	Разработка и включение мероприятий по цифровизации в паспорт регионального проекта "Умный город", и реализация включенных мероприятий	Мероприятия по цифровизации городского хозяйства включены в паспорт регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" и реализуются на территории городских округов с 2019 года.	не выполнено	реализация мероприятия будет описана по итогам года
2.4.	Предоставление иных жилищных субсидий на оплату коммунальных платежей гражданам, проживающим в многоквартирных домах и на территории населенных пунктов края	министерство жилищно-коммунального хозяйства края, органы местного самоуправления (по согласованию)	Проведение работ по благоустройству общественных территорий муниципального образования, предусмотренных проектом создания комфортной городской среды, содержащий описание в текстовой и графической формах функций одной или нескольких взаимосвязанных общественных территорий муниципального образования края, комплекса мероприятий по их благоустройству, а также описание прогнозируемого развития общественной территории муниципального образования края, направленных в том числе на улучшение архитектурного облика муниципального образования края, создание пешеходных и туристических маршрутов, условий для рекреации и занятий спортом, повышение уровня санитарно-эпидемиологического и экологического	Победителем в Конкурсе на 2022 – 2023 годы от Хабаровского края в номинации "Малые города с численностью населения от 20 000 до 30 000 человек" в Министре России признан проект городского поселения "Город Советская Гавань" – "Площадь Победы с обустройством парка им. Никитатора Николая". Срок окончания реализации Проекта по графику выполнения работ, подписанный краем и Министром России – 01.11.2023. Контракт на выполнение строительных-монтажных работ заключен 30.06.2022 с подрядной организацией ООО "ДВ-Строй". На реализацию проекта в 2022 году направлено 90,95 млн. рублей (средства федерального бюджета – 70,00 млн. рублей). На отчетную дату работы на объекте ведутся.	не выполнено	срок окончания реализации - 2023 год
3.	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к многоквартирным домам в населенных пунктах края	министерство жилищно-коммунального хозяйства края, органы местного самоуправления (граждане)				
3.1.	Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов обязательств муниципальных образований края на ремонт дворовых территорий и капитальному ремонту и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	министерство жилищно-коммунального хозяйства края, органы местного самоуправления (по согласованию), собственники (граждане)	Проведение работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий в 2022 году с использованием субсидии (в случае предоставления субсидии)	Реализация мероприятия в 2022 году не планируется ввиду с отпуском финансирования.	не выполнено	

И.о. министра жилищно-коммунального хозяйства

С.В. Кондаков

ОТЧЕТ


об использовании бюджетных ассигнований краевого бюджета на реализацию государственной программы "Формирование современной городской среды"
за 9 месяцев 2022 года

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объем бюджетных ассигнований (млн.			Профинансиро- вано (млн. рублей)	Кассовые расходы (млн. рублей)	Заклучено государственных контрактов за отчетный период (млн. рублей)	Заклучено	
			предусмотр но в программе (на отчетную дату)	предусмотр ено в законе о краевом бюджете (на отчетную дату)	предусмотрено сводной бюджетной росписью (на отчетную дату)				единиц	объем принятых обязательств (млн. рублей)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Программа "Формирование современной городской среды"	Всего	1 556,045	1 556,045	1 556,045	1 018,062	1 005,350			
		в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета	1 528,798	1 528,798	1 528,798	1 006,651	995,442			
		Министерство жилищно-коммунального хозяйства края	1 556,045	1 556,045	1 556,045	1 018,062	1 005,350			
		Соисполнитель	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1.	Поддержка муниципальных программ по формированию современной городской среды	Всего	1 121,000	1 121,000	1 121,000	801,997	798,029			
		в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета	1 121,000	1 121,000	1 121,000	801,997	798,029			
		Министерство жилищно-коммунального хозяйства края	1 121,000	1 121,000	1 121,000	801,997	798,029			
		Соисполнитель	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1.1.	Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по реализации муниципальных программ формирования современной городской среды на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	Всего	1 121,000	1 121,000	1 121,000	801,997	798,029			
		в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета	1 121,000	1 121,000	1 121,000	801,997	798,029			
		Министерство жилищно-коммунального хозяйства края	1 121,000	1 121,000	1 121,000	801,997	798,029			
		Соисполнитель	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
2.	Реализация регионального проекта "Формирование комфортной городской среды"	всего	435,045	435,045	435,045	216,065	207,321			
		в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета	407,798	407,798	407,798	204,654	197,413			
		министерство жилищно-коммунального хозяйства края	435,045	435,045	435,045	216,065	207,321			
		соисполнитель	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
2.1.	Поддержка муниципальных программ по формированию современной городской среды	всего	348,245	348,245	348,245	185,922	184,773			
		в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета	337,798	337,798	337,798	180,345	179,229			
		министерство жилищно-коммунального хозяйства края	348,245	348,245	348,245	185,922	184,773			
		соисполнитель	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
	Создание комфортной городской среды в малых	Всего	86,800	86,800	86,800	30,143	22,548			

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объем бюджетных ассигнований (млн.			Профинансировано (млн. рублей)	Кассовые расходы (млн. рублей)	Заключено государственных контрактов за отчетный период (млн. рублей)	Заключено	
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено в законе о краевом бюджете (на отчетную дату)	предусмотрено сводной бюджетной росписью (на отчетную дату)				единиц	объем принятых обязательств (млн. рублей)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2.	городах и исторических поселениях - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета	70,000	70,000	70,000	24,309	18,184			
		министерство жилищно-коммунального хозяйства края	86,8000	86,800	86,800	30,143	22,548			
		соисполнитель	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
		всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
3.	Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края на мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	краевой бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
		в том числе средства федерального бюджета	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
		бюджеты муниципальных образований края *	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			

И.о. министра жилищно-коммунального хозяйства

С.В. Кондаков



**о расходах федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств
за 9 месяцев 2022 года**

(млн. руб.)

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Оценка расходов		Профинансировано	Кассовые расходы	Освоено
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено по уточненным данным (на отчетную дату)			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Государственная программа Хабаровского края "Формирование современной городской среды"	Всего	1 607,397	1 607,397	1 051,859	1 039,147	1 038,197
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Краевой бюджет	1 556,045	1 556,045	1 018,062	1 005,350	1 004,400
		в том числе средства краевого бюджета, источником из них направленные на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства	1 528,798	1 528,798	1 006,651	995,442	994,520
		бюджеты муниципальных образований	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	51,352	51,352	33,797	33,797	33,797
			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.	Поддержка муниципальных программ по формированию современной городской среды	всего	1 139,029	1 139,029	816,252	812,294	812,294
		краевой бюджет	1 121,000	1 121,000	801,997	798,029	798,029
		в том числе средства федерального бюджета	1 121,000	1 121,000	801,997	798,029	798,029
		бюджеты муниципальных образований края	18,029	18,029	14,265	14,265	14,265
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.	Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по реализации муниципальных программ формирования современной городской среды на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.	всего	1 139,029	1 139,029	816,252	812,294	812,294
		краевой бюджет	1 121,000	1 121,000	801,987	798,029	798,029
		в том числе средства федерального бюджета	1 121,000	1 121,000	801,997	798,029	798,029
		бюджеты муниципальных образований края*	18,029	18,029	14,265	14,265	14,265
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.	Реализация регионального проекта "Формирование комфортной городской среды"	всего	468,368	468,368	235,597	226,853	225,903
		краевой бюджет	435,045	435,045	216,065	207,321	206,371
		в том числе средства федерального бюджета	407,798	407,798	204,654	197,413	196,491
		бюджеты муниципальных образований края	33,323	33,323	19,532	19,532	19,532
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1.	Поддержка муниципальных программ по формированию современной городской среды	всего	377,418	377,418	204,376	203,227	202,277
		краевой бюджет	348,245	348,245	185,922	184,773	183,823
		в том числе средства федерального бюджета	337,798	337,798	180,345	179,229	178,307
		бюджеты муниципальных образований края	29,173	29,173	18,454	18,454	18,454
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.4	Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	всего	90,950	90,950	31,221	23,626	23,626
		краевой бюджет	86,800	86,800	30,143	22,548	22,548
		в том числе средства федерального бюджета	70,000	70,000	24,309	18,184	18,184
		бюджеты муниципальных образований края	4,150	4,150	1,078	1,078	1,078
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края на реализацию	всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		в том числе средства федерального бюджета	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Оценка расходов		Профинансировано	Кассовые расходы	Освоено
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено по уточненным данным (на отчетную дату)			
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Образования края на мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	бюджеты муниципальных образований края *	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

И.о. министра жилищно-коммунального хозяйства

С.В. Кондаков



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о ходе реализации мероприятий
государственной программы Хабаровского края
"Формирование современной городской среды"
за 9 месяцев 2022 года

В целях создания условий для системного повышения качества и комфорта городской среды для жителей края, повышения уровня благоустройства территорий муниципальных образований края, разработана и утверждена постановлением Правительства Хабаровского края от 31.08.2017 № 356-пр государственная программа Хабаровского края "Формирование современной городской среды" (далее – Программа).

Для достижения целей Программы необходимо решение следующих задач:

- благоустройство общественных территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды в муниципальных образованиях края;
- вовлечение граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях края, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, в решение вопросов развития городской среды;
- разработка и реализация перечня мероприятий по цифровизации городского хозяйства края;
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципальных образований.

I. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы

В 2022 году к достижению предусмотрено 9 показателей (индикаторов).

По состоянию на 01 октября 2022 г. показатели не выполнены, находятся в работе.

II. Сведения о степени выполнения мероприятий Программы

С учетом доведенных объемов финансирования в 2022 году запланировано к реализации 3 мероприятия.

Основное мероприятие "Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды":

1) разработка нормативных правовых актов Хабаровского края и органов местного самоуправления Хабаровского края по формированию современной городской среды.

В 2022 году актуализирована государственная программа Хабаровского края ""Формирование современной городской среды"", утвержденная поста-

новлением Правительства края от 31.08.2017 № 356-пр (постановления Правительства края от 13.01.2022 N 2-пр, от 31.03.2022 N 164-пр).

Муниципальные программы муниципальных образований края – участников регионального проекта также актуализируются ежегодно, в том числе по итогам проведения онлайн голосования по отбору общественных территорий, подлежащих первоочередному благоустройству.

В паспорт регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2022 году внесены изменения 21.02.2022, 22.06.2022, 20.09.2022, 10.10.2022.

2) Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по реализации муниципальных программ формирования современной городской среды на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

Иные межбюджетные трансферты на 2022 год – 1 121,00 млн. рублей.

План – 160 дворовых территорий, находящихся в центрах экономического роста Хабаровского края:

- г. Хабаровск (53 территории);
- г. Комсомольск-на-Амуре (60 территорий);
- г. Амурск (13 территорий);
- г. Бикин (5 территорий);
- г. Вяземский (4 территории);
- г. Николаевск-на-Амуре (7 территорий);
- г. Советская Гавань (13 территорий);
- рп. Чегдомын (3 территории);
- рп. Ванино (2 территории).

На 01.10.2022 завершены 20 дворовых территорий.

В рамках национального проекта ""Жилье и городская среда"" реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий не осуществляется с 2019 года.

Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Формирование комфортной городской среды":

1) поддержка муниципальных программ по формированию современной городской среды

Участниками проекта в 2022 году стали 53 муниципальных образований края. План – 91 общественная территория.

Общий бюджет составит не менее 377,4 млн. рублей, в том числе:

- федерального бюджета – 337,8 млн. рублей;
- краевого бюджета – 10,4 млн. рублей;
- местных бюджетов прогноз – 29,2 млн. рублей.

Контракты заключены на все территории. По состоянию на 01.10.2022 работы завершены на 57 территориях, ведутся работы на 34 территории.

"2) организация и проведение общественных обсуждений с целью вовлечения граждан в принятие решений по вопросам развития городской среды.

Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды в муниципальных образованиях Хабаровского края, в том числе по результатам Всероссийского онлайн голосования на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru, проведенного в период с 15 апреля по 31 мая 2022 года.

3) разработка и реализация перечня мероприятий по цифровизации городского хозяйства края:

Мероприятия по цифровизации городского хозяйства включены в паспорт регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" и реализуются на территории городских округов с 2019 года.

4) предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований края на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Победителем в Конкурсе на 2022 – 2023 годы от Хабаровского края в номинации "Малые города с численностью населения от 20 000 до 50 000 человек" в Минстрой России признан проект городского поселения "Город Советская Гавань" – "Площадь Победы с обустройством парка им. Императора Николая".

Срок окончания реализации Проекта по графику выполнения работ, подписанный краем и Минстроем России – 01.11.2023.

Контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен 30.06.2022 с подрядной организацией ООО "ДВ-Строй".

На реализацию проекта в 2022 году направлено 90,95 млн. рублей (средства федерального бюджета – 70,00 млн. рублей). На отчетную дату работы на объекте ведутся.

Основное мероприятие Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к многоквартирным домам в населенных пунктах края.

1) Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края на мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Реализация мероприятия в 2022 году не планируется в связи с отсутствием финансирования.

III. Сведения об использовании бюджетных ассигнований краевого бюджета и иных средств на реализацию государственной программы, в том числе данные о профинансированных расходах, фактическом освоении полученных средств и причины не освоения в полном объеме бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию Программы


В 2022 году на реализацию Программы предусмотрено 1 607,397 млн. рублей, в том числе:

- 1 528,798 млн. рублей – средства федерального бюджета,
- 27,247 млн. рублей – средства краевого бюджета
- 51,352 млн. рублей – средства бюджетов муниципальных образований края.

По состоянию на 01.10.2020 кассовое исполнение реализации Программы составило 1 039,147 млн. рублей (64,44 % от предусмотренного плана), в том числе:

- 1 005,350 млн. рублей – средства краевого бюджета, из них – 995,442 млн. рублей – средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, 18,454 млн. рублей – средства краевого бюджета;
- 33,797 млн. рублей – средства бюджетов муниципальных образований края.

И.о. министра жилищно-коммунального хозяйства края

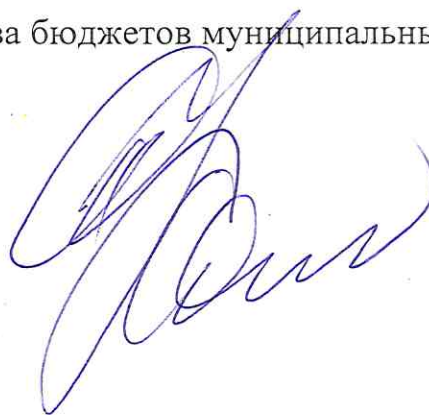

С.В. Кондаков
